

利府の新しい交流拠点

利府町文化交流センター建築工事
建築だより 第6号
(令和2年3月発行)


利府町文化交流センターは、町の新しいブランド力になる豊かな文化を育む交流の拠点として整備を推進しております。
完成まで楽しみにお待ちください。



作成：利府町役場 文化複合施設推進室
株式会社佐藤総合計画
五洋・小坂橋特定建設工事共同企業体

1階平面図（写真撮影位置）

C地点
【北西角 施設入口付近】
B地点【おはなしのへや】
A地点【図書館 南西角】

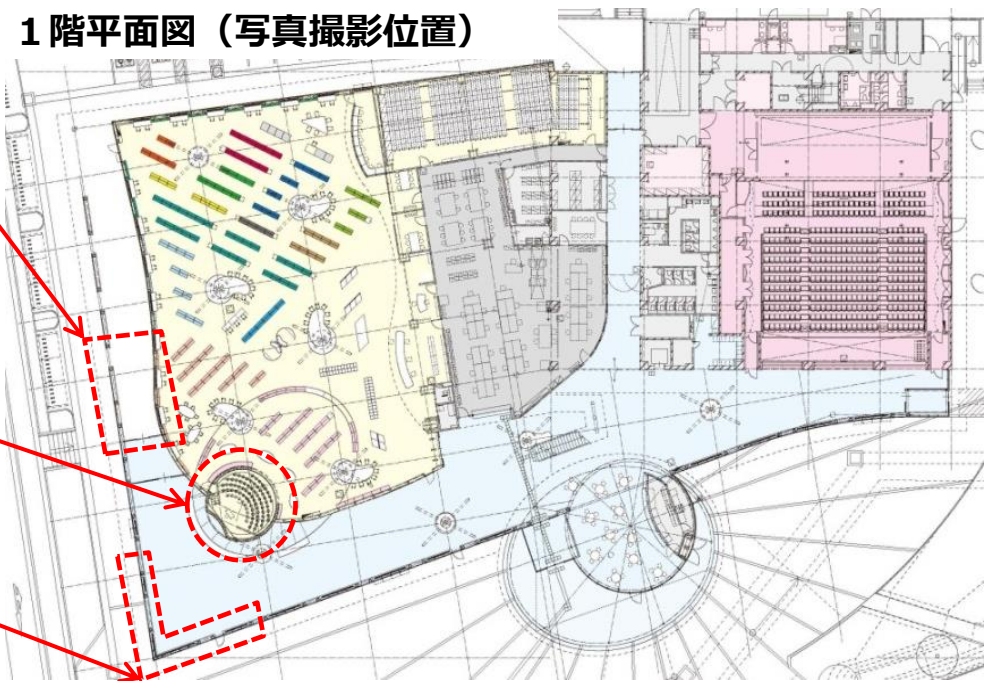


1. はじめに

少しずつ日が長くなり、春の訪れを感じる季節となりました。
工事現場では、部分的に床が出来上がり建物の大きさが分かるようになってきました。
基礎工事も終盤です。次の工程の鉄骨組立ても交えてお伝えいたします。

2. 工事の様子

A地点【図書館 南西角】

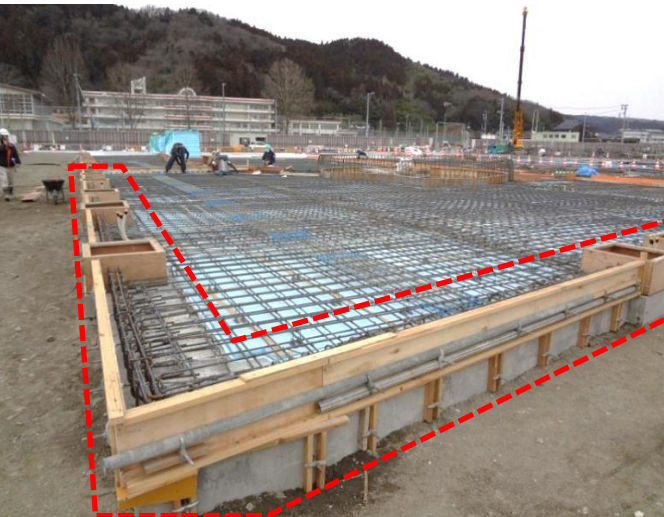

床の鉄筋が組まれた状態です。
床下からの冷気を抑える断熱材（青色）も見えます。

A地点【図書館 南西角】




床コンクリート打設後です。
エントランスホールの床が出来上がりました。

B地点【図書館 おはなしのへや】



円状になっている部分は図書館の中にある『おはなしのへや』です。

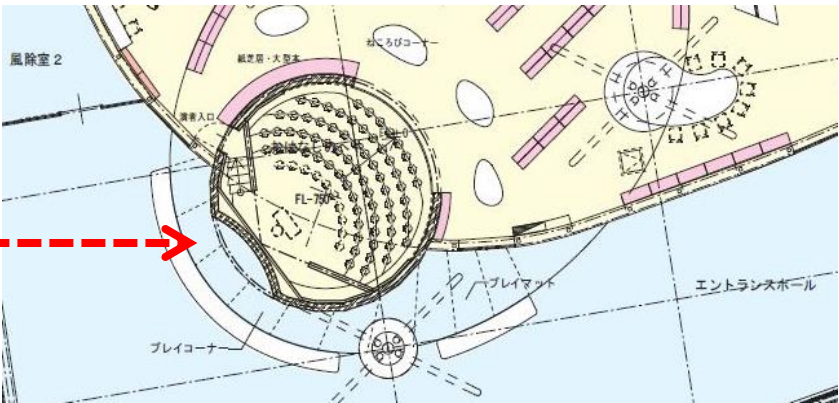


おはなしのへやは、5～6歳のこどもが車座で80人程度入れる広さです。
絵本の読み聞かせや映像資料の視聴などを想定しているスペースです。

C地点【北西角 施設入口付近】



北西角の施設入口付近です。図書館との間の壁は一部がガラス張りとなり、明るい雰囲気になる予定です。

3. 場内全景写真

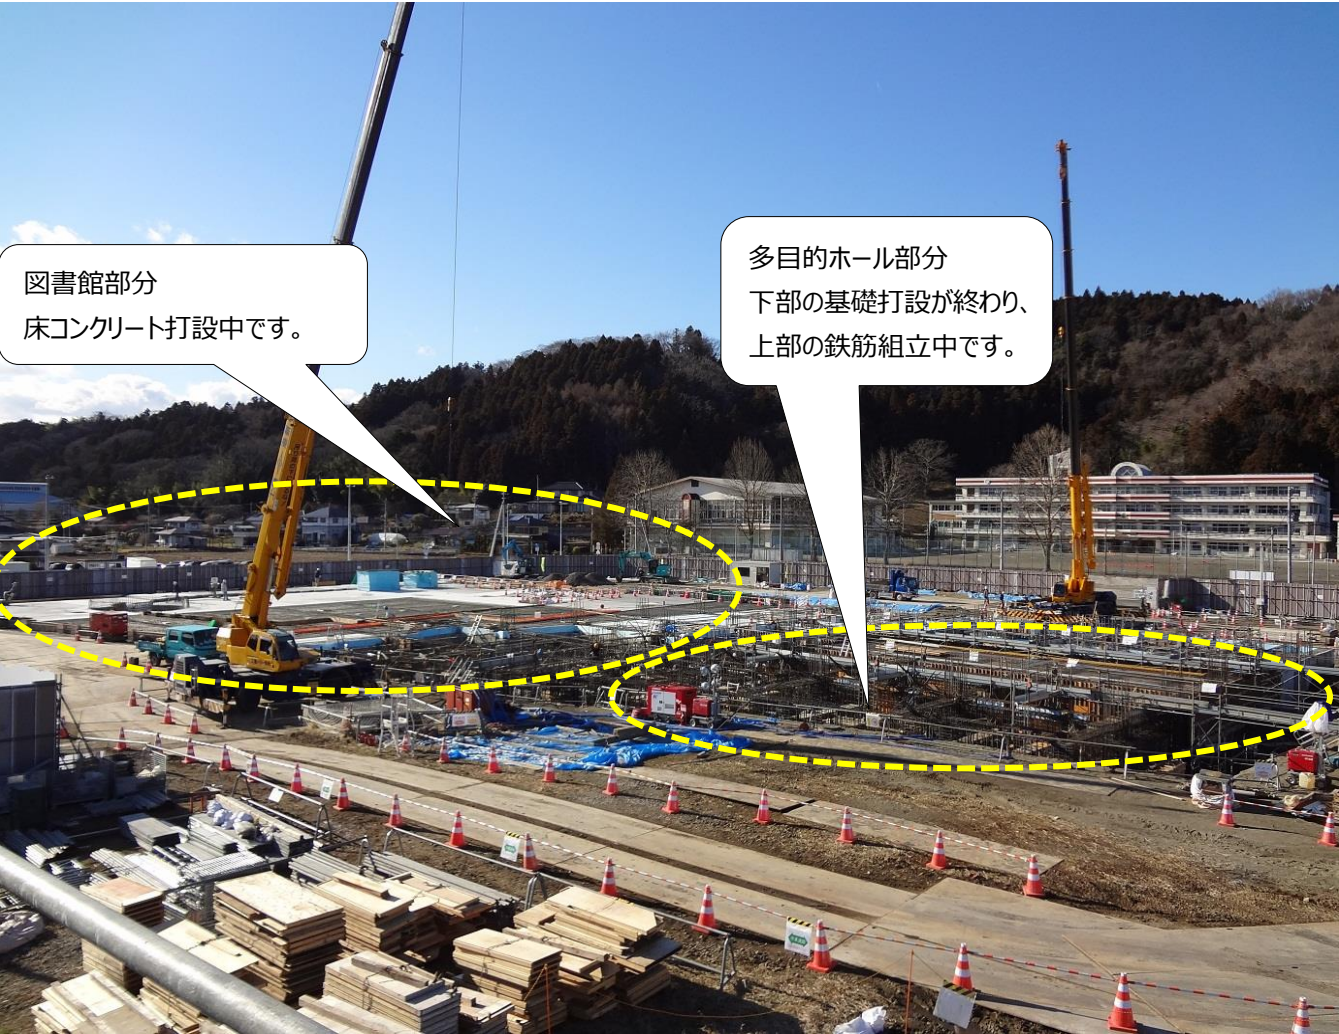

図書館部分
床コンクリート打設中です。

多目的ホール部分
下部の基礎打設が終わり、
上部の鉄筋組立中です。

4. 鉄骨製作工場の様子（鉄骨部材を工場で製作し現場で組立てます。）



↑ 骨組みとなる鉄骨の部材を工場で製作中です。
↓ 木をイメージした構造体『エコツリー』の一部。




5. 今後のスケジュール

3月の主な工事予定

3月上旬～3月下旬	基礎工事（鉄筋組立、コンクリート打設）、1階床コンクリート打設
※ 3月も基礎工事を建物のエリアごとに順番に工事していきます。 3月で基礎工事は概ね終了し、4月からはいよいよ鉄骨の組立が始まります。 建物の形が出来上がっていきますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひご覧ください。	

5. 現場コラム

今月で基礎工事も概ね完了します。今回は、基礎スリーブ工事について紹介します。
基礎の中には水道管や排水管、電気の配線等の様々な管が入っています。時には基礎を貫通させて配管しなければならないこともあります。その際には強度を考慮しながら、スリーブという管を入れていきます。

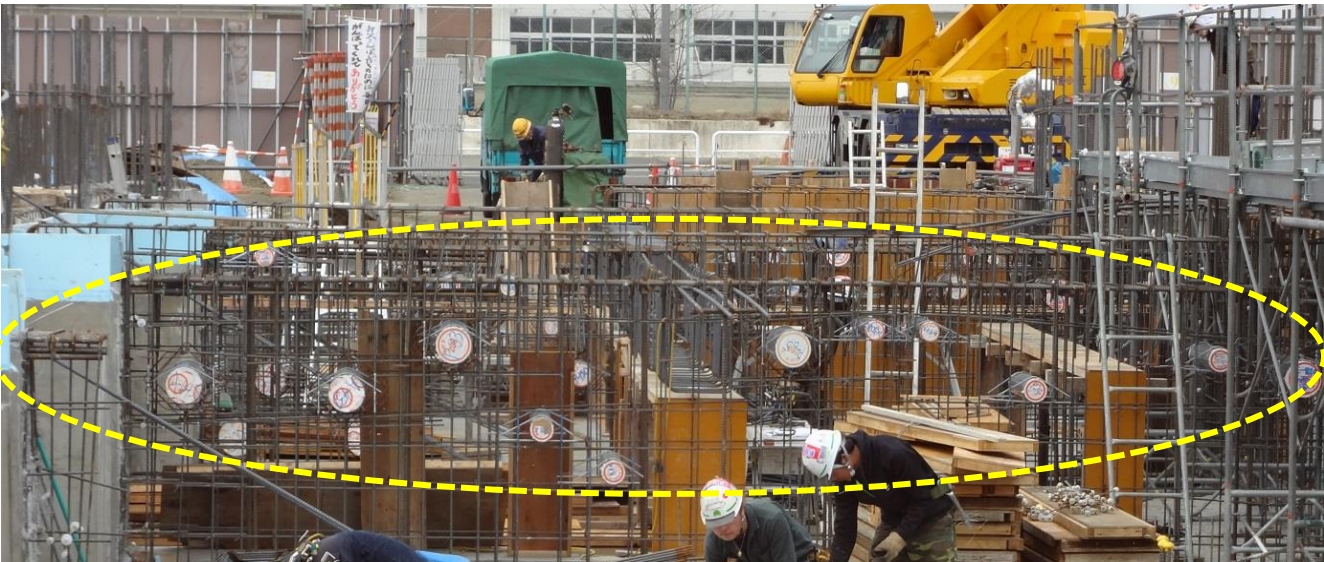

↑ 基礎を貫通するスリーブ。



↑ 近くからみた基礎スリーブ。



↑ 大きい貫通部分はひし形の鉄筋を使います。



↑ 大きいスリーブは人が通れる人通り口です。



← 完成した人通り口。
建物が完成しても、基礎内に
潜って移動し配管メンテナンス
ができるように計画されています。

◆ 町民の皆様へ ◆

工事の内容によって、朝の7時や夕方19時頃まで作業を行う場合があります。
皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

