

利府の新しい交流拠点

利府町文化交流センター建築工事 建築だより 第8号 (令和2年5月発行)

利府町文化交流センターは、町の新しいブランド力になる豊かな文化を育む交流の拠点として整備を推進しております。完成まで楽しみにお待ちしております。




作成：利府町役場 文化複合施設推進室
株式会社佐藤総合計画
五洋・小坂橋特定建設工事共同企業体

1. はじめに

先月の立柱式から1ヶ月が経過し、鉄骨建て方工事も順調に進んでいます。第8号では様々なアングルから鉄骨建て方工事の様子をお伝えします。工事の中でも一番の見どころポイントの工程です。

2. 場内全景写真

こちらの写真は、5月21日時点での現場の様子です。建物の形が少しずつできてきました。利府街道側の歩道橋の上っていただくと建物全体が見えますので、お近くを通った際はぜひ見てみてください。向かって左側から図書館、公民館、多目的ホールとなっています。

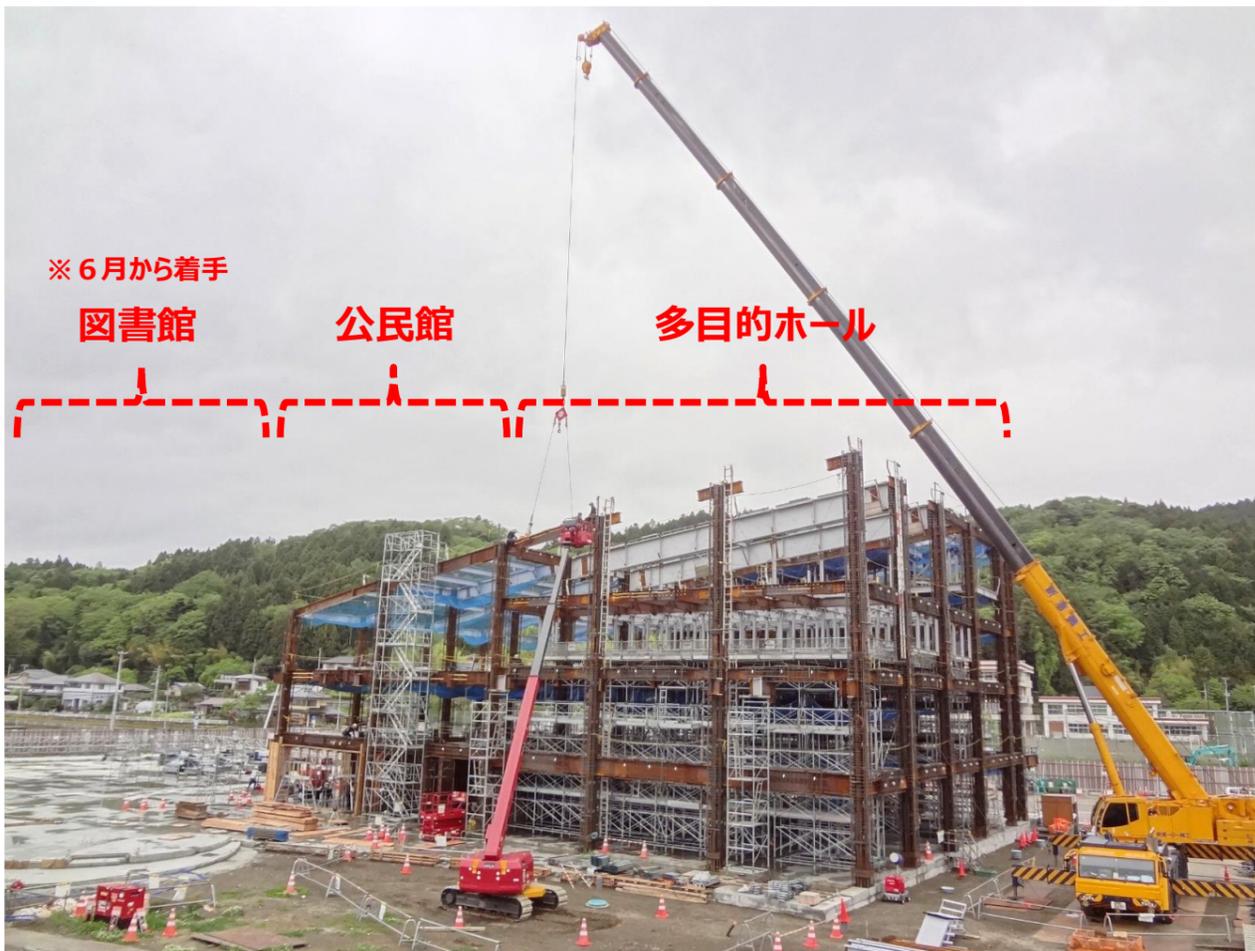

3. 各エリアごとの進捗状況



①おはなしのへや



図書館内に設置する『おはなしのへや』の状況です。5～6歳の子ども達に絵本の読み聞かせをしたり、映像資料の視聴などを想定しているスペースです。丸い特徴的な形をコンクリートで作成するため、それに合わせて木の型枠や鉄筋も曲線で仕上げています。

②SRC造柱の様子



SRC造は鉄骨に鉄筋コンクリート施した構造体です。鉄骨の組立て前に鉄筋を取付け、組立て後は周囲に型枠を設置しコンクリートを流し込みます。これによって強固な構造体が完成します。


③多目的ホールの梁の状況



※鉄骨工場での梁材の様子

鉄骨工場で見えた骨太な梁材が現場で組み立てられました。多目的ホールの大きな屋根を支える部材として使用されています。

4. アングル別 建物の様子

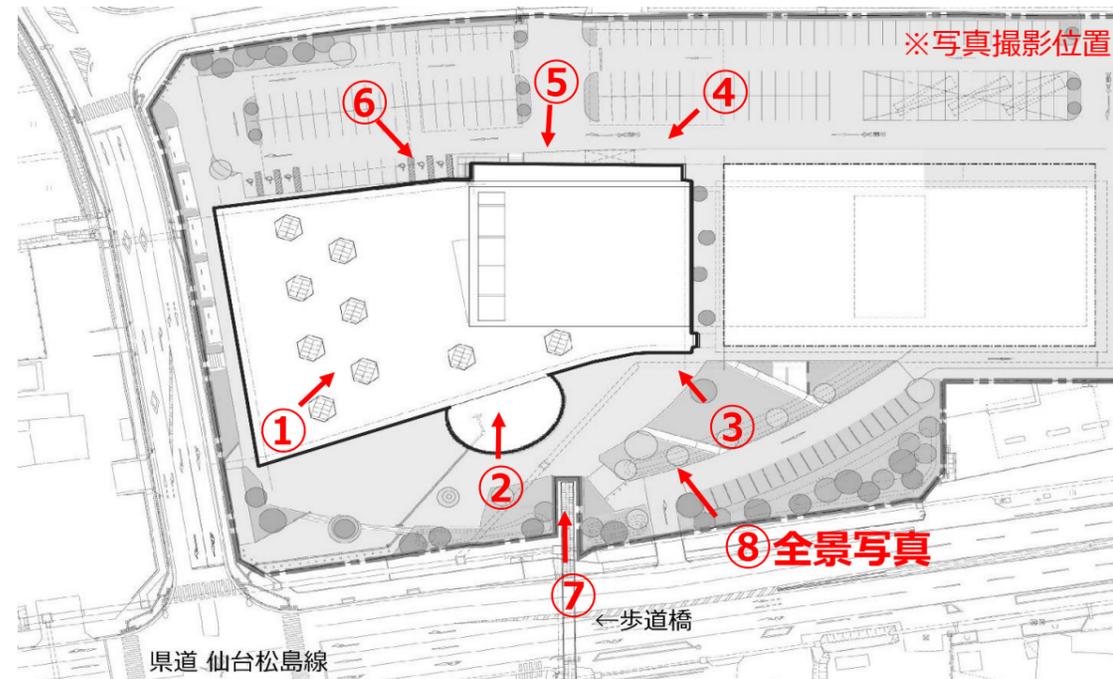

①南西側から



②南側から



③南東側から



④北東側から



⑤北側から



⑥北西側から



⑦歩道橋から ※ぜひ上ってみて下さい



⑧全景写真 ※順調に進んでいます。



4/20

5/21

5. 今後のスケジュール

5月以降の主な工事予定

5月以降も引き続き鉄骨の建て方工事を行います。6月に入ると図書館部分の工事も始まります。6月下旬から7月上旬頃に鉄骨工事が完了し、その後は外壁や屋根の工事に入っていきます。

6. 現場コラム ※公民館について

現場では鉄骨工事が順調に進んでおり、公民館・多目的ホール部分を先行して工事中です。今回は新しい公民館についてご紹介します。

◆研修室 1～4

※部屋を連結しての利用も可能。

◆創作室 1, 2

※ものづくりに最適なお部屋です。

◆クッキングスタジオ


※最新の設備で料理教室などの利用を想定しています。

◆和室

※約15畳の広々とした和室です。

◆スタジオ 1, 2

※今までの公民館には無かった施設です。コーラスやオーケストラの練習、バンド演奏など多彩な音楽活動に利用できます。

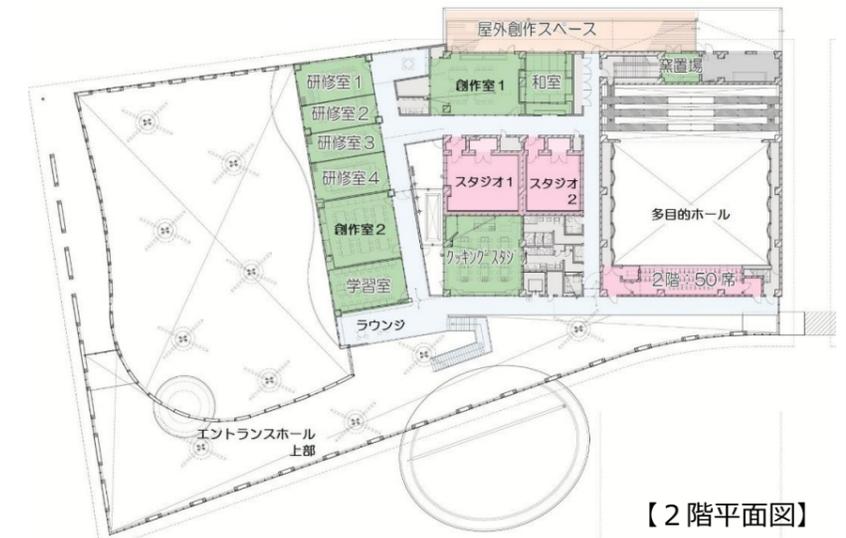

【2階平面図】

上記のような、多様な施設を準備しています。町民の方はもちろんですが、町外の方や小中高生にも幅広く使ってもらえる施設を目指して工事を進めています。ここで新しい交流生まれたり、趣味や生きがいを見つけ生活がより豊かになる人が増えれば嬉しいです。

◆町民の皆様へ◆

工事の内容によって、朝の7時から夕方19時頃まで作業を行う場合があります。皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

