

利府の新しい交流拠点

利府町文化交流センター建築工事 建築だより 第10号 (令和2年7月発行)

利府町文化交流センターは、町の新しいブランド力になる豊かな文化を育む交流の拠点として整備を推進しております。完成まで楽しみにお待ちください。



作成：利府町役場 文化複合施設推進室
株式会社佐藤総合計画
五洋・小坂橋特定建設工事共同企業体


1. はじめに

昨年の11月から始まった『建築だより』も今回で第10号となりました。工事現場では建物全体の骨組みが完成し、外壁工事や内部の工事が始まっています。各部屋が少しずつ形作られており、特に図書館の吹抜空間と前回ご紹介したエコツリーとの組合せはとても壮大で施設のシンボルとなりそうです。今回は図書館の完成予想図もご紹介します。

2. 場内全景写真


7月21日現在の現場の様子です。特徴的な丸い部分の交流ラウンジまで建て方が完了しました。雨の日が続いていますが、安全に配慮しながら工事が順調に進んでいます。

外部は外壁工事や屋根の防水工事等が進行中です。内部では屋根が架かり、これから部屋を区切る壁が徐々にでき始めています。現場の最新情報をお伝えします。

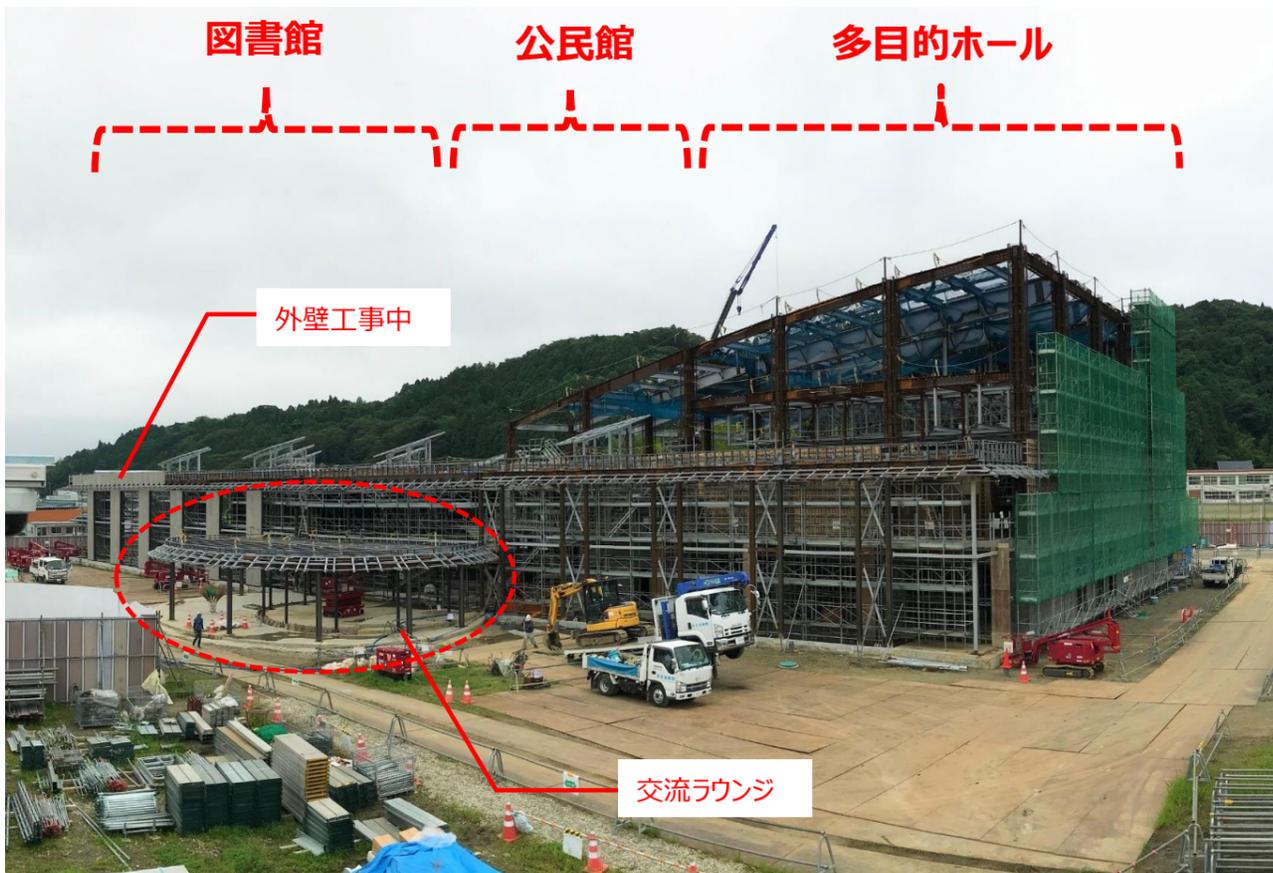

3. 各エリアごとの進捗状況

①図書館・事務室部分の様子

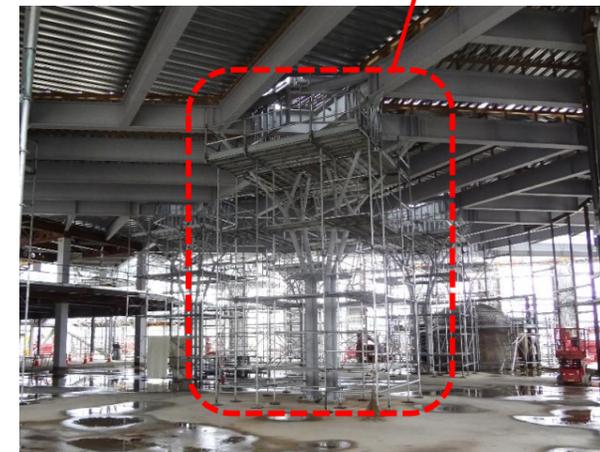


エコツリー

エコツリーが大きな屋根を支えます。
足場がはずれると上部の排煙窓から光が差し込みます



天井まで届く大きな開口部

天井高は約7mです。
天井まで大きく開いた開口部が室内を照らします。

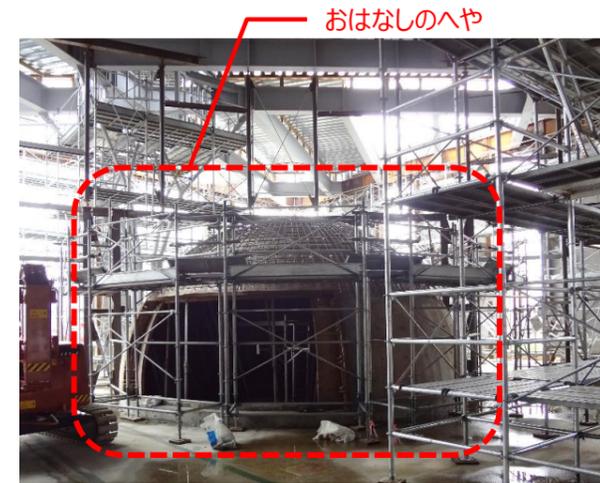

おはなしのへや

球状のおはなしのへやです。
下半分までコンクリートが打ち終わりました。



事務室部分


事務室部分です。
これから壁や天井などを作る内装工事が始まります。

②2階公民館部分の様子



研修室部分

2階研修室部分です。

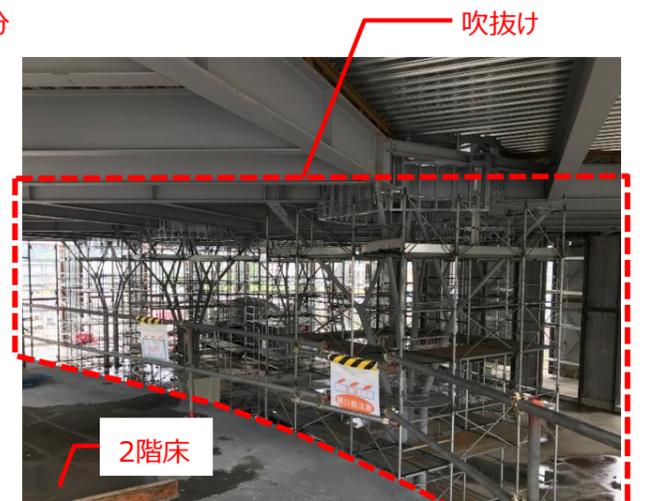

吹抜け

2階床

図書館は吹抜けになっています。

4. 方角別 外観進捗状況



◆外壁工事ビフォーアフター◆



5. 今後のスケジュール

8月の主な工事予定

先月から引続き外壁工事と内部のコンクリート打設を行います。
また、月の後半からは外部サッシの取付工事が始まります。

6. 現場コラム ※図書館の完成予想図のご紹介

鉄骨工事、エコツリーの組立が完了し、施設の大まかな形が完成しました。特に図書館部分については大きな吹抜け空間があり、とても開放的で魅力的な空間となる予定です。
今回は図書館部分についてご紹介をします。

◆図書館の完成予想パース◆ ※細かい仕様は完成までの間に変更になる可能性があります。




★ダイナミックな吹抜けは約7m！これは十符の里プラザの吹抜けよりも高く、更に開放的になります！★

天井高 約6m



天井高 約7m

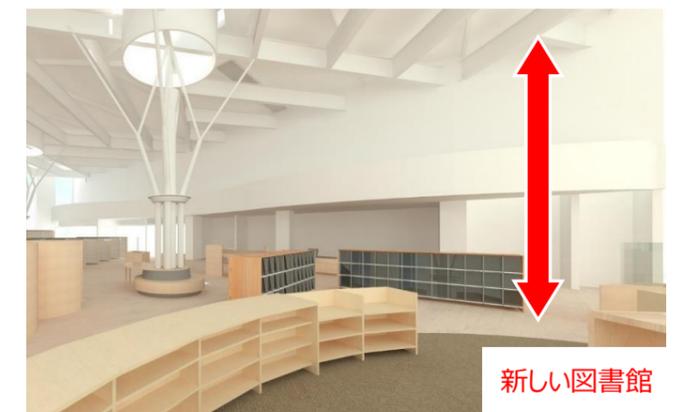

◆町民の皆様へ◆

工事の内容によって、朝の7時から夜19時頃まで作業を行う場合があります。
皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

