

利府の新しい交流拠点

利府町文化交流センター建築工事
建築だより 第11号
(令和2年8月発行)

利府町文化交流センターは、町の新しいブランド力になる豊かな文化を育む交流の拠点として整備を推進しております。
完成まで楽しみにお待ちください。




作成：利府町役場 文化複合施設推進室
株式会社佐藤総合計画
五洋・小坂橋特定建設工事共同企業体

1. はじめに

令和元年7月に起工式を執り行ってから1年が経過し、建築工事も着々と進んでいます。
外部が形作られ、徐々に内部のほうへ工事が移ってきました。完成へ向けてカラーリングの選定なども始まってきております。今回は図書館のイメージ図をご紹介しましたが、今回は多目的ホールの完成イメージ図を後半の現場コラムでご紹介します。


2. 場内全景写真

8月13日現在の現場の様子です。1、2階の外壁が張り終わりました。3階部分は外壁のコンクリートの打設が進んでいます。これから徐々に仕上げの塗装や屋根の工事が始まります。
また、北側から順番にサッシの取付工事が始まっています。※写真は2ページ目にあります。
外部は大まかな形が出来上がり、内部の工事へと進んでいます。

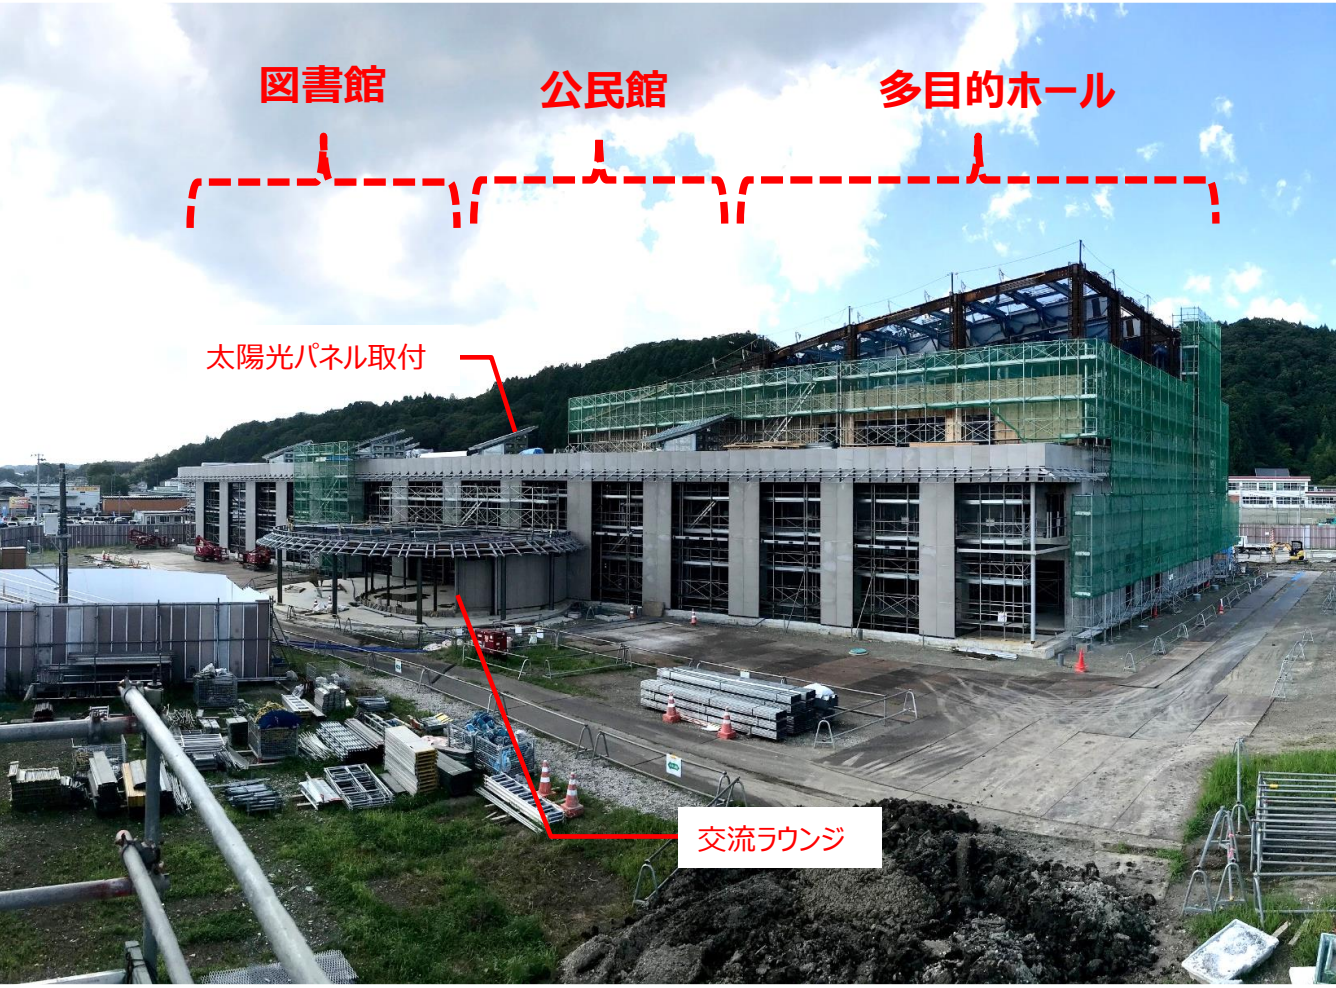

3. 各エリアごとの進捗状況

①1階部分の様子

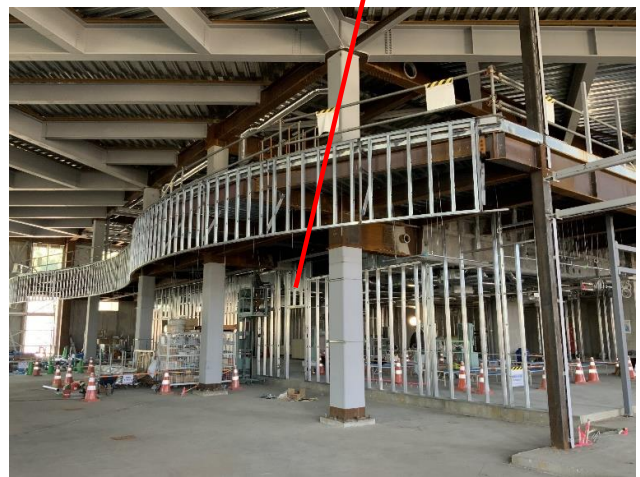


図書館の貸出カウンターになる部分です。内部の間仕切り壁を作っています。部屋の形が作られてきています。



事務室部分です。設備の配管が見えます。天井を張ると見えなくなる部分です。



多目的ホールの入口です。エントランスホールとは可動式の壁で区切られており、一体的に使うことが可能です。

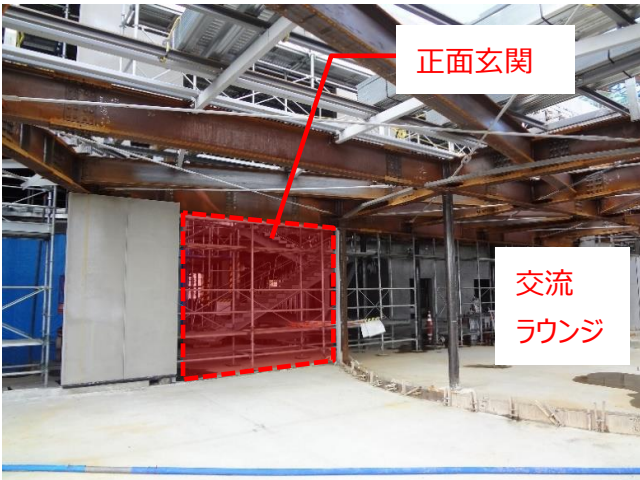

赤で囲った部分が施設南側の正面玄関です。隣はガラス張りの交流ラウンジになります。

②2階公民館部分の様子



2階の中廊下に光を取り入れる光庭です。



2階トイレの配管。事前に配管してから床コンクリートを打設しています。

4. 方角別 外観進捗状況

①南東から

7月21日



8月13日



北、西、南側まで外壁工事が進みました！

②南西から

7月21日



8月13日



外壁、サッシの取付が順調に進んでいます。

③北西から

7月21日



8月13日



縦長の大きなサッシが入りました！

5. 今後のスケジュール


9月の主な工事予定

外部では外壁のコンクリート打設、屋根、サッシの取付等を引き続き行います。
内部では内壁の工事、換気や空調及び給排水の設備工事を進めていきます。


6. 現場コラム ※多目的ホールの完成予想図のご紹介

今回は多目的ホールの完成イメージをご紹介します。座席数は約430席となり講演会等の催し物や吹奏楽、合唱の発表会等に利用できます。また座席は前後に格納することが可能（下記図をご覧ください）で体育館のようなオープンスペースとして利用することも可能です。

◆多目的ホールの完成予想パース◆ ※細かい仕様は完成までの間に変更になる可能性があります。

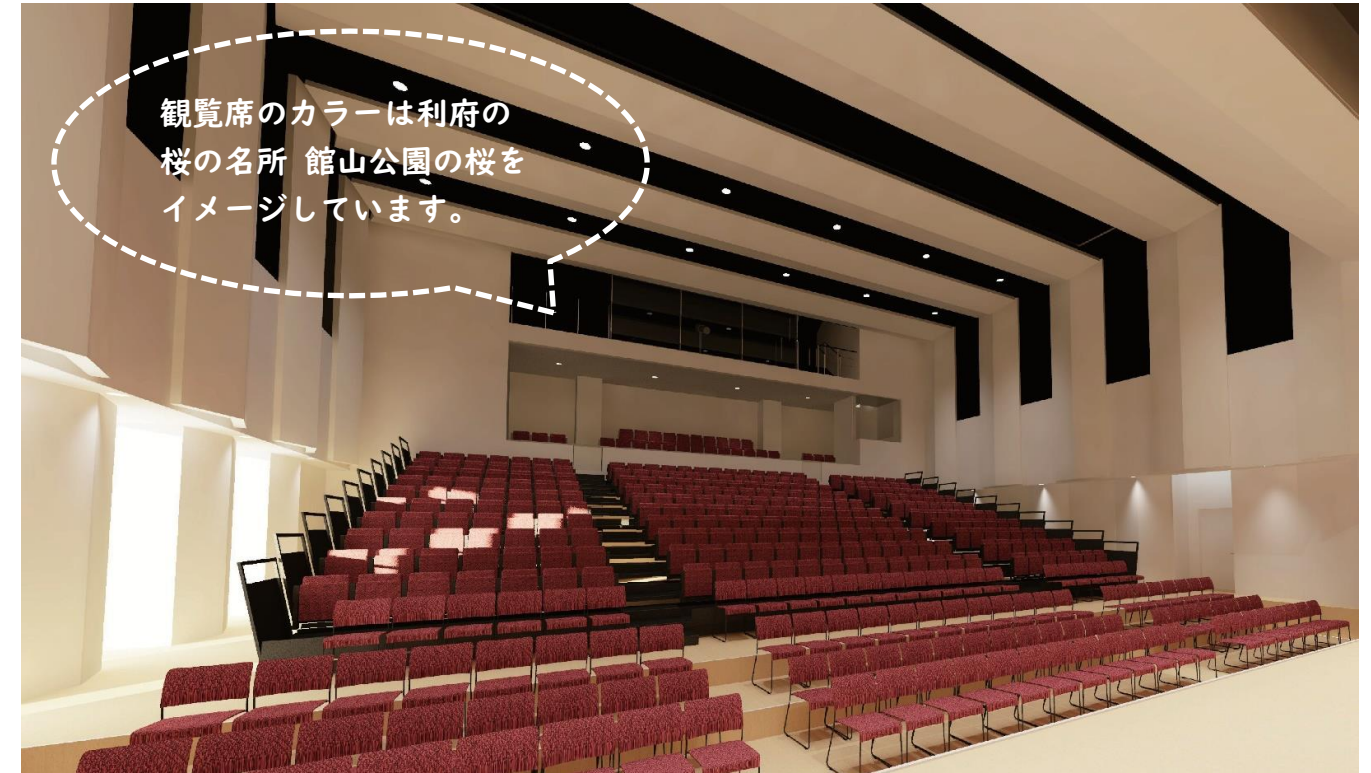

◆小ホールの利用パターン例（イメージ図）

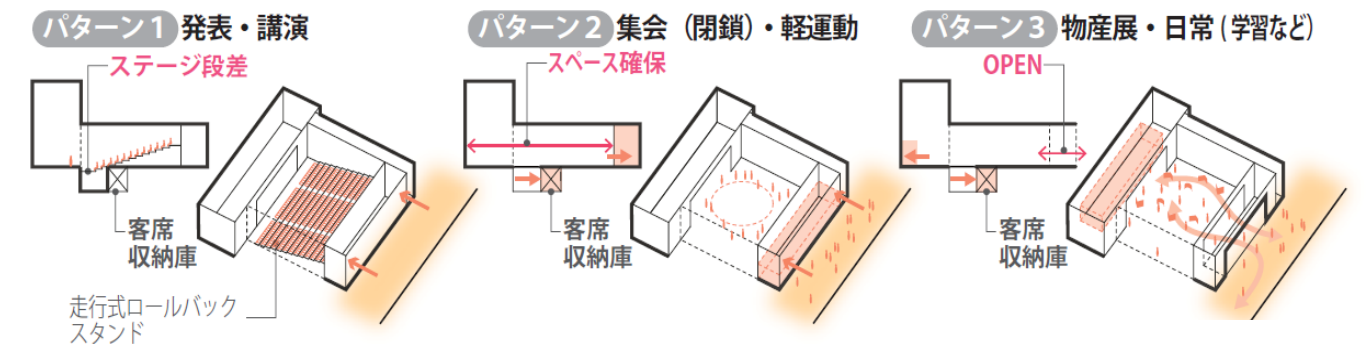

上の図のように観覧席は前後に収納が可能となっています。

◆パターン1（観覧席を展開した場合）：発表や講演の場としての利用を想定しています。

◆パターン2（観覧席を後ろに格納する）：エントランスホールとのつながりが遮断され、非公開の集会や軽運動等に利用できます。

◆パターン3（観覧席を前に格納する）：エントランスホールと続き間となり、物産展や展覧会など多くの方が行き来するイベントに利用できます。

◆町民の皆様へ◆

工事の内容によって、朝の7時からや夜19時頃まで作業を行う場合があります。
皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

