

## 利府の新しい交流拠点

# 利府町文化交流センター建築工事 建築だより 第14号 (令和2年11月発行)

利府町文化交流センターは、町の新しいブランド力になる豊かな文化を育む交流の拠点として整備を推進しております。完成まで楽しみにお待ちしております。



作成：利府町役場 文化複合施設推進室  
株式会社佐藤総合計画  
五洋・小板橋特定建設工事共同企業体

### 1. はじめに

建物外部を覆っていた足場が徐々に解体され、綺麗な白い外壁が露わとなってきました。11月末現在で工事の進捗率は85%程度まで進んでいます。工事の中心は内部の仕上工事や外構工事へと移ってきています。

### 2. 場内全景写真

11月24日時点での現場の様子です。外壁工事は円形のカフェの部分を残しほぼ完成しました。建物の外では外構工事が進捗中で工事車両が日々動き回っています。また、工事を待つ材料が整理整頓されて並べられています。



### 3. 各エリアごとの進捗状況

#### ①1階図書館部分の様子

10月20日



11月24日



床の下地となる合板が張られました。壁も一部を残し白く塗装されています。これから床・壁の仕上げと本棚や机等の家具設置の工事が進んでいきます。完成までもう少しです。




球体の『おはなしのへや』も白に塗装されています。この周辺は児童書コーナーとなる予定です。



ここは『静読室』です。壁で仕切られており、静かに読書ができるスペースとなります。


#### ②多目的ホールの様子

昇降床

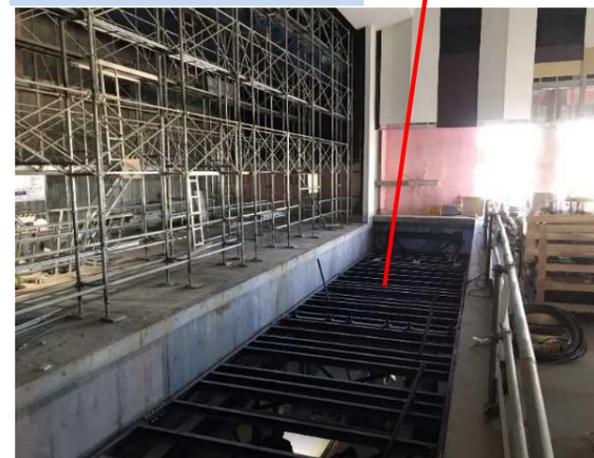

多目的ホールには一部昇降する床があります。写真は床下に機械を組み立てるところです。

舞台

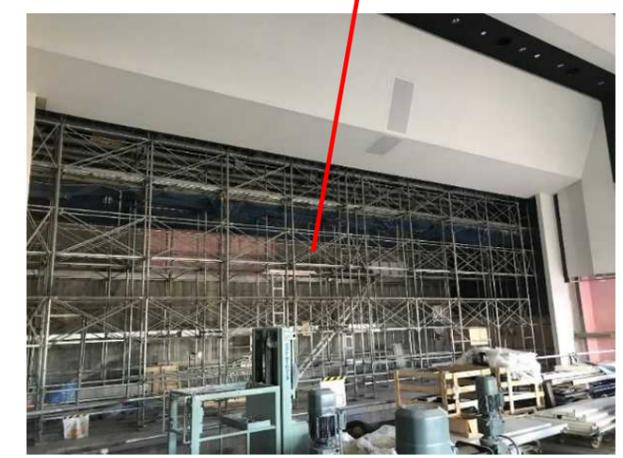

舞台側を撮影した写真です。まだ足場が残っていますが、少しずつ形が見えてきました。

### ③水式床冷暖房工事の様子



1階のエントランスホールの様子です。エントランスホールの一部は床冷暖房が入っており写真はその配管の様子です。夏場は冷水、冬場は温水を循環させて冷暖房を行います。

### ④外構工事の様子



利府街道側には一部に緑地帯を整備します。



スロープの工事中です。奥には駐輪場があり、自転車での来館にも配慮しています。



交差点から見た施設の外観です。左側の門扉にはロゴマークが設置される予定です。

### 4. 今後のスケジュール

#### 12月の主な工事予定

建物の内部では仕上げの工事が進んでいきます。年内中には多目的ホール内の移動客席の工事が始まる予定です。外部では引き続き外構工事が進捗していきます。

### 5. 現場コラム ※建物外観について

建物の外観が概ね出来上がり完成までもう少しのところまでやってきました。今回は建物の外観デザインについてご紹介します。



【完成イメージ図】




【現場写真】

左が完成イメージ図で右が実際の現場写真です。イメージに近い形で完成しつつあります。文化交流センターは「大きな屋根の下に賑わいが生まれる」をコンセプトに図書館・公民館・多目的ホール等の文化会館の3つの施設が大きな屋根に包まれた外観となっています。外部のカラーは利府を連想させる梨と桜の2つの花の色から引用しています。建物の内部に入るとこの大きな屋根を「エコツリー」が支えています。当初のコンセプトのとおり、多くの方に施設を利用いただき「賑わい」が生まれることを願い整備を進めています。



【屋根を支えるエコツリー】

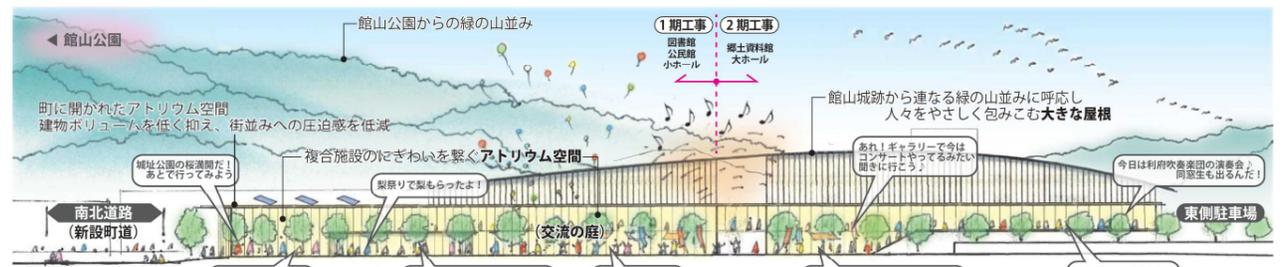

【基本設計プロポーザル時の設計者のイメージ図】

### ◆町民の皆様へ◆

工事の内容によって、朝の7時から夜19時頃まで作業を行う場合があります。皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

